


## 江井ヶ島松陰新田線の整備について

都市計画道路江井ヶ島松陰新田線の整備について、2023年度(令和5年度)の完成を目指して取り組みを進めており、現在の状況等を報告します。

### 1 事業概要

- (1) 事業名称 東播都市計画道路事業 3.3.101号 江井ヶ島松陰新田線
- (2) 事業期間 2016年度(H28年度)～2023年度(R5年度)
- (3) 総事業費 約14億円
- (4) 用地買収 権利者数：43名(共有者含む。)、面積：約25,000㎡(96筆)
- (5) 物件補償 建物等：14件(牛舎、倉庫、工作物など)
- (6) その他 関連事業として、既設道路との接続部における交差点改良や既設水路の改修等を計画しています。

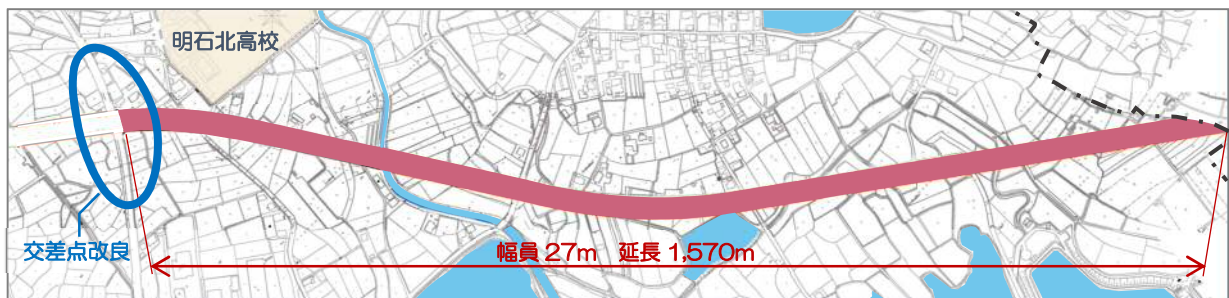

### 2 現在の状況

順次、権利者と交渉を行っています。令和3年度末時点での契約締結の見込みとしては、用地買収の面積ベースで、約5割程度となる予定です。

用地買収が完了した区間について、側溝を設置する工事を予定しています。

### 3 全体スケジュール

|              | H28                                    | H29 | H30 | R1                                    | R2                                    | R3                                    | R4 | R5 |
|--------------|--|-----|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----|----|
| 測量<br>設計     | [Progress bar spanning from H28 to R4] |     |     |                                       |                                       |                                       |    |    |
| 物件調査         |  |     |     | [Progress bar spanning from R1 to R2] |                                       |                                       |    |    |
| 用地買収<br>物件補償 |  |     |     |                                       |                                       | [Progress bar spanning from R3 to R4] |    |    |
| 道路工事         |  |     |     |                                       | [Progress bar spanning from R2 to R5] |                                       |    |    |
